

Data ogłoszenia: 11.12.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobrańzową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3**”

Przedmiot zamówienia:

robota budowlana	<input type="checkbox"/>
usługa	<input checked="" type="checkbox"/>
dostawa	<input type="checkbox"/>

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie pełnienia czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór projektanta i wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn.:

„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobrańzową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3**”

WYMAGANIA FRANCFZYZODAWCY ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE WSZYSTKIM OFERENTOM, KTÓRZY SPEŁNIĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika Oświadczenia o Poufności stanowiącego Załącznik nr 11 do Ogłoszenia
- Przesłaniu kurierem, pocztą na adres: PHH Hotele Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa podpisanego Oświadczenia o Poufności, bądź dostarczenie Oświadczenia osobiście do sekretariatu Zamawiającego Oświadczenia należy dostarczać w zamkniętych kopertach oznaczonych: Oświadczenie o Poufności – Inwestor Zastępczy Huzar

Data ogłoszenia: 11.12.2020

- Powiadomienie o wysłaniu, bądź dostarczeniu oświadczenia mailowo, na adres: k.gutowski@phhhotele.pl
- Po otrzymaniu oryginału oświadczenia w wersji papierowej, Organizator wysyła Wymagania Francyzodawcy na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

Usługa obejmuje również nadzór nad wykonywaniem przez Wykonawców robót budowlanych i projektantów obowiązków wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady w okresie jej trwania.

Opis jakościowy:

Usługa będąca przedmiotem zamówienia polega na kompleksowej obsłudze zadania inwestycyjnego wraz z jego rozliczeniem, a także udział w przeglądach gwarancyjnych Inwestycji, a w szczególności:

- 1) Przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji wraz z wyznaczeniem kamieni milowych i ścieżki krytycznej oraz monitorowanie realizacji harmonogramu,
- 2) Wizję lokalną oraz ocenę stanu obecnego obiektu,
- 3) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie projektanta dla zadania inwestycyjnego p.n.:
„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobrażową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań francyzodawcy i standardu 3*”
- 4) Przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego postępowania przetargowego oraz wyłonienie projektanta dla zadania inwestycyjnego p.n.:
„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobrażową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań francyzodawcy i standardu 3*”
- 5) Nadzorowanie prac Projektanta, konsultowanie proponowanych rozwiązań w porozumieniu z Zamawiającym. Bieżące kontrolowanie harmonogramu i alarmowanie w przypadku jego przekroczenia,
- 6) Zweryfikowanie dokumentacji projektowej (m. in. analiza dokumentacji pod względem kompletności, zastosowanych rozwiązań, pod względem ekonomiczności, rozwiązań

Data ogłoszenia: 11.12.2020

- potencjalnych problemów na etapie wykonywania prac, itp.), przygotowanie w porozumieniu z Projektantem wszelkich niezbędnych dokumentów umożliwiających uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na Budowę,
- 7) Zweryfikowanie przedmiarów i kosztorysów robót pod kątem poprawności wykonania, przyjętych ilości i przydatności do przeprowadzenia postępowania przetargowego,
 - 8) Występowanie w imieniu Zamawiającego do Projektanta w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, lub braków w dokumentacji w celu ich usunięcia,
 - 9) Weryfikację i akceptację poprawek dokumentacji przygotowanych przez Projektanta,
 - 10) Przygotowanie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Generalnego Wykonawcy dla zadania inwestycyjnego p.n.:
„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”
 - 11) Przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego postępowania przetargowego oraz wyłonienie Generalnego Wykonawcy dla zadania inwestycyjnego p.n.:
„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”
 - 12) Sprawowanie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru inwestycyjnego we wszystkich branżach, wynikających z Inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 - 13) Przygotowanie i przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych,
 - 14) Obsługa finansowa Inwestycji – na każdym etapie prac,
 - 15) Obsługa prawna Inwestycji – na każdym etapie prac,

Szczegółowy zakres obowiązków i czynności Inwestora Zastępczego:

1. Przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji wraz z wyznaczeniem kamieni milowych i ścieżki krytycznej oraz monitorowanie realizacji harmonogramu,
 - Przedstawienie Zamawiającemu ogólnego harmonogramu dla inwestycji wraz z wyszczególnieniem kamieni milowych i ścieżki krytycznej,
 - Monitorowanie realizacji harmonogramu i bieżące raportowanie z realizacji harmonogramu Zamawiającemu (od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji):

Data ogłoszenia: 11.12.2020

- Przedstawianie dwutygodniowych raportów z realizacji harmonogramu wraz ze wskazaniem procentu realizacji zadań,
- Przedstawianie zadań, których realizacja w terminie jest zagrożona,
- Alarmowanie Zamawiającego o zbliżaniu się, bądź przekroczeniu ścieżki krytycznej w związku z realizacją poszczególnych zadań,
- Konsultacja i podejmowanie działań w celu przyspieszenia prac i nieprzekraczania bądź minimalizacji przekraczania ścieżki krytycznej dla poszczególnych zadań.

2. Wizja lokalna oraz ocena stanu obecnego obiektu

- Inwestor Zastępczy przeprowadzi wizję lokalną obiektu, z której sporządzi raport ze wskazaniem głównych zagrożeń i problemów, które mogą się pojawić w trakcie realizacji inwestycji oraz proponowanych działań prewencyjnych.

3. Przygotowanie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie Projektanta dla inwestycji p.n.

„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3**”

- Inwestor Zastępczy przygotowuje w uzgodnieniu z Zamawiającym postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie projektanta, który sporządzi dokumentację projektową dla w.w. zadania. Projekty modernizacji będą wykonywane na podstawie wytycznych w związku z franczyzą, która będzie wprowadzana w obiekcie.
- Szczegóły dotyczące Franczyzodawcy oraz jego wytyczne zostaną przekazane Inwestorowi Zastępczemu po podpisaniu Oświadczenia o Poufności zgodnie z procedurą opisaną na początku Opisu Przedmiotu Zamówienia,
- Projekt modernizacji będzie ukierunkowany na dostosowanie obiektu do standardu 3*.
- Zamawiający zakłada utworzenie w obiekcie nie mniej niż 120 pokoi.
- Inwestor Zastępczy przesyła przygotowane dokumenty postępowania do akceptacji Zamawiającego
- W terminie 24h od akceptacji Zamawiającego, Inwestor Zastępczy zamieszcza postępowanie i przesyła zaproszenia do złożenia oferty potencjalnym oferentom.
- Postępowania przetargowe będą ogłoszone przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego.
 - Zamawiający zamieści ogłoszenie o przetargu wraz ze wszystkimi załącznikami na swojej stronie internetowej.
 - Inwestor Zastępczy zamieści ogłoszenia o postępowaniu na własnej stronie internetowej, oraz na co najmniej dwóch portalach przetargowych.

Data ogłoszenia: 11.12.2020

- Ponadto, Inwestor Zastępczy ma obowiązek wysłać zaproszenie mailowe do złożenia oferty do co najmniej 15 oferentów działających w branży właściwej dla tematyki postępowania.
- Zamawiający zachowuje prawo do zgłoszenia dowolnej liczby oferentów, do których Inwestor Zastępczy będzie miał obowiązek wysłać zaproszenie do złożenia oferty.

4. Przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego postępowania przetargowego mającego oraz wyłonienie Projektanta dla inwestycji p.n.:

„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”

- Do przeprowadzenia postępowania zostanie powołana komisja przetargowa zgodnie z regulaminem Zamawiającego. Inwestor Zastępczy powoła komisję przetargową złożoną z co najmniej 4 Inspektorów Nadzoru . Project Managera, Inżynierów Projektu i przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia dowolnej liczby członków komisji. Powołanie komisji odbywać się będzie poprzez złożenie wniosku do Zarządu Zamawiającego z podaniem pełnego składu komisji i przedstawieniem dokumentów postępowania.
- Oferty w postępowaniu zbiera Inwestor Zastępczy. Oferty powinny być zbierane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią złożonych ofert przed terminem komisyjnego otwarcia ofert.
- Inwestor Zastępczy w terminie 7 dni od zamieszczenia postępowania ma obowiązek telefonicznie potwierdzić u wszystkich zaproszonych Oferentów zamiar złożenia oferty w postępowaniu
- W terminie 8 dni od zamieszczenia postępowania Inwestor Zastępczy przedstawi Zamawiającemu raport z przeprowadzonych rozmów telefonicznych.
- Inwestor Zastępczy w trakcie postępowania będzie przewodniczyć wizjom lokalnym na terenie obiektu dla zainteresowanych Oferentów,
- W terminie maksymalnie 3 dni od terminu składania ofert Inwestor Zastępczy zorganizuje komisyjne otwarcie ofert w obecności co najmniej dwóch przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający będzie miał możliwość zgłoszenia dowolnej liczby przedstawicieli. Z otwarcia ofert zostanie spisany protokół zawierający istotne informacje dla oceny ofert.
- W terminie maksymalnie 3 dni od otwarcia ofert, Inwestor Zastępczy przedstawi Zamawiającemu analizę ofert pod kątem formalnym i technicznym,
- W terminie maksymalnie 5 dni od przekazania analizy ofert, Inwestor Zastępczy, w porozumieniu z Zamawiającym zorganizuje spotkania negocjacyjne z Oferentami
- W spotkaniach negocjacyjnych będzie brała udział komisja przetargowa,

Data ogłoszenia: 11.12.2020

- W terminie maksymalnie 2 dni od ostatniego spotkania Inwestor Zastępczy przedstawi Zamawiającemu raport z każdego spotkania wraz ze wszystkimi ustaleniami.
 - W przypadku wezwania Oferentów do złożenia aktualizacji ofert, Inwestor Zastępczy zbiera aktualizacje ofert i przesyła Zamawiającemu analizę aktualizacji ofert w terminie maksymalnie 2 dni od ich złożenia,
 - Komisja przetargowa w terminie maksymalnie 2 dni od przekazania ostatniego raportu/analizy podejmie decyzję o wyborze oferty. Inwestor Zastępczy przygotowuje końcowy protokół z prac komisji z uzasadnieniem wyboru oferty.
Umowę z wybranym Wykonawcą podpisuje Zamawiający na podstawie wcześniej przygotowanego wzoru. Wzór umowy (stanowiący załącznik do postępowania) będzie przygotowany przez Inwestora Zastępczego. Wzór umowy przed zamieszczeniem postępowania musi uzyskać akceptację Biura Prawnego Zamawiającego.
 - Oferta powinna uwzględniać możliwość dwukrotnego powtórzenia postępowania w przypadku, gdy :
 - zaistnieją przesłanki do unieważnienia postępowania,
 - w postępowaniu wpłyną mniej niż 3 poprawnie złożone oferty spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego,
 - oferty złożone w postępowaniu będą znacząco przekraczały budżet założony przez Zamawiającego
5. Nadzorowanie prac Projektantów, konsultowanie proponowanych rozwiązań w porozumieniu z Zamawiającym. Bieżące kontrolowanie harmonogramu i alarmowanie w przypadku jego przekroczenia,
- Inwestor Zastępczy będzie na bieżąco nadzorował prace projektantów. W porozumieniu z Zamawiającym będzie odpowiadać na pytania związane z projektem.
 - Obowiązkiem Inwestora Zastępczego będzie monitorowanie prac projektantów pod kątem harmonogramu. Inwestor Zastępczy będzie wymagać od projektantów informacji na temat zaawansowania prac i w razie gdyby projektant przekraczał terminy umowne, będzie zobowiązany do wzywania Projektanta do przyspieszenia prac.
 - Inwestor Zastępczy będzie zobowiązany do wspierania projektantów w procesie uzyskiwania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych.
6. Zweryfikowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym dokumentacji projektowej (m. in. analiza dokumentacji pod względem kompletności, zastosowanych rozwiązań, pod względem ekonomiczności rozwiązań potencjalnych problemów na etapie wykonywania prac, itp.) , przygotowanie w porozumieniu z Projektantem wszelkich niezbędnych dokumentów umożliwiających uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na Budowę,
oraz
7. Zweryfikowanie przedmiarów i kosztorysów robót pod kątem poprawności wykonania, przyjętych ilości i przydatności do przeprowadzenia postępowania przetargowego,

Data ogłoszenia: 11.12.2020

- Odbiór dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz sprawdzenie i ocena poprawności wykonania powyższych dokumentów, między innymi:
 - sprawdzenie kompletności oraz poprawności wykonania projektu w zakresie merytorycznym, prawnym i ekonomii budowlanej;
 - sprawdzenie zgodności i kompletności składających się na dokumentację opracowań i dokumentów (w szczególności ich zgodności z kosztorysami) oraz weryfikacja ewentualnych błędów lub wyjaśnianie niezgodności;
 - wskazanie i wyegzekwowanie ewentualnych zmian lub poprawek w przedłożonej dokumentacji projektowej;
 - weryfikacja dokumentacji; w wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Inwestor Zastępczy sporządzi koreferat dokumentacji zawierający podsumowanie wykonanych prac sprawdzających i wnioski dla Zamawiającego, tj.:
 - ✓ informację czy na podstawie sprawdzanej dokumentacji można przeprowadzić poprawne postępowanie na wykonanie robót budowlanych,
 - ✓ wskazanie zagrożeń, jakie mogą powstać przy realizacji projektu.
 - ✓ inne uwagi i konkluzje mające znaczenie dla projektu.
 - Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej.
 - Występowanie do instytucji i urzędów, w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych, przez cały okres jej trwania.
 - Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 - Zaznajomienie zespołu wyznaczonych inspektorów z poszczególnych branż z dokumentacją projektową, terenem budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz warunkami technicznymi przyłączenia poszczególnych mediów.
8. Występowanie w imieniu Zamawiającego do Projektanta w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, lub braków w dokumentacji w celu ich usunięcia,
9. Weryfikacja i akceptacja poprawek dokumentacji przygotowanych przez Projektanta,
- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, lub braków w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Inwestor Zastępczy, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego koreferatu dokumentacji, wystąpi do projektanta o usunięcie nieprawidłowości lub braków w dokumentacji,
 - Obowiązkiem Inwestora Zastępczego będzie odbiór poprawionej dokumentacji, jej sprawdzenie i skonsultowanie z Zamawiającym, oraz Francyzodawcą.

Data ogłoszenia: 11.12.2020

10. Przygotowanie postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie Generalnego Wykonawcy dla inwestycji p.n. :

„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobrażową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3**

- Inwestor Zastępczy, przygotowuje postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Generalnego Wykonawcy w zakresie wnętrz, elewacji i dachu (przygotowanie wszystkich dokumentów postępowania zgodnie z Regulaminem Zakupów zamawiającego – wyciąg z regulaminu zostanie udostępniony IZ po podpisaniu umowy).
- Inwestor Zastępczy przesyła przygotowane dokumenty postępowania do akceptacji Zamawiającego.
- W terminie 24h od akceptacji Zamawiającego, Inwestor Zastępczy zamieszcza postępowanie i przesyła zaproszenia do złożenia oferty potencjalnym oferentom.
- Postępowania przetargowe będą ogłoszone przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego.
 - Zamawiający zamieści ogłoszenie o przetargu wraz ze wszystkimi załącznikami na swojej stronie internetowej.
 - Inwestor Zastępczy zamieści ogłoszenia o postępowaniu na własnej stronie internetowej, oraz na co najmniej dwóch portalach przetargowych.
 - Ponadto, Inwestor Zastępczy ma obowiązek wysłać zaproszenie mailowe do złożenia oferty do co najmniej 15 oferentów działających w branży właściwej dla tematyki postępowania.
 - Zamawiający zachowuje prawo do zgłoszenia dowolnej liczby oferentów, do których Inwestor Zastępczy będzie miał obowiązek wysłać zaproszenie do złożenia oferty.

11. Przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego postępowań przetargowych oraz wyłonienie Generalnego Wykonawcy dla inwestycji p.n. :

„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobrażową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3**

- Do przeprowadzenia postępowania zostanie powołana komisja przetargowa zgodnie z regulaminem Zamawiającego. Inwestor Zastępczy powoła komisję przetargową złożoną z co najmniej 4 Inspektorów Nadzoru . Project Managera, Inżynierów Projektu i przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia dowolnej

Data ogłoszenia: 11.12.2020

liczby członków komisji. Powołanie komisji odbywać się będzie poprzez złożenie wniosku do Zarządu Zamawiającego z podaniem pełnego składu komisji i przedstawieniem dokumentów postępowania.

- Oferty w postępowaniu zbiera Inwestor Zastępczy. Oferty powinny być zbierane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią złożonych ofert przed terminem komisyjnego otwarcia ofert.
- Inwestor Zastępczy w terminie 7 dni od zamieszczenia postępowania ma obowiązek telefonicznie potwierdzić u wszystkich zaproszonych Oferentów zamiar złożenia oferty w postępowaniu
- W terminie 8 dni od zamieszczenia postępowania Inwestor Zastępczy przedstawi Zamawiającemu raport z przeprowadzonych rozmów telefonicznych.
- Inwestor Zastępczy w trakcie postępowania będzie przewodniczyć wizjom lokalnym na terenie obiektu dla zainteresowanych Oferentów,
- W terminie maksymalnie 3 dni od terminu składania ofert Inwestor Zastępczy zorganizuje komisyjne otwarcie ofert w obecności co najmniej dwóch przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający będzie miał możliwość zgłoszenia dowolnej liczby przedstawicieli. Z otwarcia ofert zostanie spisany protokół zawierający istotne informacje dla oceny ofert.
- W terminie maksymalnie 3 dni od otwarcia ofert, Inwestor Zastępczy przedstawi Zamawiającemu analizę ofert pod kątem formalnym i technicznym,
- W terminie maksymalnie 5 dni od przekazania analizy ofert, Inwestor Zastępczy zorganizuje spotkania negocjacyjne z Oferentami wskazanymi przez Zamawiającego na podstawie analizy ofert Inwestora Zastępczego.
- W spotkaniach negocjacyjnych będzie brała udział komisja przetargowa,
- W terminie maksymalnie 2 dni od ostatniego spotkania Inwestor Zastępczy przedstawi Zamawiającemu raport z każdego spotkania wraz ze wszystkimi ustaleniami.
- W przypadku wezwania Oferentów do złożenia aktualizacji ofert, Inwestor Zastępczy zbiera aktualizacje ofert i przesyła Zamawiającemu analizę aktualizacji ofert w terminie maksymalnie 2 dni od ich złożenia,
- Komisja przetargowa w terminie maksymalnie 2 dni od przekazania ostatniego raportu/analizy podejmie decyzję o wyborze oferty. Inwestor Zastępczy przygotowuje końcowy protokół z prac komisji z uzasadnieniem wyboru oferty.
Umowę z wybranym Wykonawcą podpisuje Zamawiający na podstawie wcześniej przygotowanego wzoru. Wzór umowy (stanowiący załącznik do postępowania) będzie przygotowany przez Inwestora Zastępczego. Wzór umowy przed zamieszczeniem postępowania musi uzyskać akceptację Biura Prawnego Zamawiającego.
- Oferta powinna uwzględniać możliwość dwukrotnego powtórzenia postępowania w przypadku, gdy :
 - zaistnieją przesłanki do unieważnienia postępowania,
 - w postępowaniu wpłyną mniej niż 3 poprawnie złożone oferty spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego,
 - oferty złożone w postępowaniu będą znacząco przekraczały budżet założony przez Zamawiającego

12. Sprawowanie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru inwestycyjnego we wszystkich branżach, wynikających z Inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, nadzór nad realizacją postanowień umowy z GW

I. W okresie realizacji robót budowlanych:

1. Przygotowanie, zorganizowanie i skoordynowanie wykonania oraz odbioru 2 pokoi wzorcowych, fragmentu korytarza i portalu windowego zgodnie z wytycznymi Franczyzodawcy
2. Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne.
3. Egzekwowanie od projektantów pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, a w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta uwag i zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez wykonawców lub Zamawiającego w toku realizacji inwestycji (nie możliwych do ustalenia na etapie projektowania) i dokonywanie z nim stosowanych zmian, uzgodnień lub wyjaśnień.
4. Kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót budowlanych i podczas przyszłego użytkowania Obiektu oraz z zasadami wiedzy technicznej.
5. Sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też dokonywanie oceny jakości elementów na placu budowy przed ich wbudowaniem.
6. Kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z postanowieniami umowy o roboty budowlane oraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
7. Opracowywanie sprawozdań dwutygodniowych z wykonanego zakresu prac.
8. Kontrolowanie prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz kontrolowanie przedkładanych kosztorysów (w tym kosztorysów dodatkowych i zamiennych oraz powykonawczych) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.
9. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie.
10. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów.

Data ogłoszenia: 11.12.2020

11. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, nadzór nad usuwaniem wad i usterek.
12. Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na budowę lub przepisami prawa.
13. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy.
14. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu.
15. Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą oraz – w razie potrzeby – z Projektantem, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania narady w dowolnym terminie.
16. Sporządzanie Notatek z narad koordynacyjnych w terminie maksymalnie 3 dni od faktycznego zakończenia narady i rozsyłanie ich do wszystkich członków narady.
17. Archiwizowanie wszystkich protokołów prób i badań, przeprowadzonych w trakcie budowy.
18. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Inwestora, a dotyczących nadzorowanych robót budowlanych.
19. Reprezentowanie Zamawiającego wobec Wykonawcy robót oraz innych jednostek biorących udział w procesie inwestycyjnym. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie, pełnienie funkcji koordynacyjnych, zarządzanie kontraktem z Wykonawcą oraz wszelkie inne prace wynikające z przepisów Prawa budowlanego i dobrych praktyk w branży budowlanej.
20. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu.
21. Egzekwowanie od Wykonawcy zakazu udziału w realizacji inwestycji podwykonawców, którzy nie zostali zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego. W przypadku dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia podwykonawcy Inwestor Zastępczy wyegzekwuje uzyskanie od Wykonawcy przekazanie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do ustalenia zakresu ewentualnej odpowiedzialności Zamawiającego i do zaakceptowania podwykonawcy. Inwestor Zastępczy przedstawi w takim wypadku Zamawiającemu rekomendację, co do akceptacji Podwykonawcy.
22. Kontrola rozliczeń finansowych Wykonawcy z jego Podwykonawcami.
23. Prowadzenie pełnej obsługi administracyjnej budowy.
24. Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Projektu ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków

Data ogłoszenia: 11.12.2020

- kierowanych do Wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.
25. Sporządzanie Aneksów, opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Umowy z Wykonawcami robót.
 26. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót.
 27. Bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i finansowym oraz ich eliminacja, raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji.
 28. Egzekwowanie, aby umowa z Wykonawcą robót została wykonana w terminie, ewentualnie zawiadomienie Zamawiającego o zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji robót. Opiniowanie przyczyny nie dotrzymania terminu wykonania zadania przez Wykonawcę robót, stanowiącej podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych ustawy KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana najpóźniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww. okoliczności.
 29. Spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe lub zamiennie wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym, kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 30. Organizowanie i dokonywanie wszelkich odbiorów wykonanych robót (częściowych, zanikających, ulegających zakryciu, zamiennych, ponaprawczych) oraz odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do: stwierdzenia kompletności dokumentacji odbiorowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, przekazania Zamawiającemu protokołu odbioru, przedstawienia stanowiska w sprawie wad stwierdzonych podczas poszczególnych odbiorów.
 31. Rozliczanie Wykonawcy robót pod względem rzeczowym i finansowym, w tym zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych w terminie 5 dni od przekazania przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego.
 32. Pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót np. o przedłużenie terminu wykonania robót, wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych oraz w zakresie obowiązujących przepisów, Inwestor Zastępczy przekaze Wykonawcy robót decyzję Zamawiającego, w terminie 3 dni, liczone od dnia otrzymania ostatecznej decyzji Zamawiającego.
 33. W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenie robót już wykonanych lub uniknięcie strat, podjęcie wiążącej decyzji co do natychmiastowego

Data ogłoszenia: 11.12.2020

- wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie Inwestor Zastępczy podejmuje w porozumieniu z Inwestorem.
34. Rozwiązywanie razem z Zamawiającym wszelkich problemów i sporów związanych z realizacją robót, w szczególności w zakresie zamiennych rozwiązań i materiałów, wad dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robót budowlanych.
 35. Podejmowanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, decyzji w kwestii wad w wykonanych robotach budowlanych, w tym ustalenie wysokości ewentualnego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, z tytułu wad.
 36. W razie konieczności, sporządzenie w ciągu 7 dni pisemnej opinii od daty przekazania przez Zamawiającego złożonego wniosku przez Wykonawcę robót w zakresie formalnym dotyczącej zmiany kierownika budowy, kierowników robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót.
 37. Przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, inwentaryzacji wykonanych robót.
 38. W przypadku przerwania umowy z Wykonawcą robót wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej udział w przejęciu placu budowy, nadzór nad robotami zabezpieczającymi, itp.
 39. Zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branżowych Inspektorów nadzoru, obmiarów robót wykonanych przez Wykonawcę robót, o ile są niezbędne.
 40. Kontrola Wykonawcy robót w zakresie bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz terenu przyległego do placu budowy.
 41. Dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone.
 42. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiegania stratom, marnotrawstwu i niegospodarności.
 43. Prowadzenie na bieżąco zestawień wykonanych prac, zgodnie z kosztorysami, przedmiarami i harmonogramami. Przedstawianie Zamawiającemu w dwutygodniowych raportach postęp prac w odniesieniu do pozycji z przedmiarów.
 44. Opiniowanie zasadności faktur wystawianych przez wykonawców robót Zamawiającemu. Uzasadnienie faktury powinno zawierać wskazanie pozycji kosztorysowych, których dotyczy faktura, oraz określenie procentu realizacji danej pozycji. Inwestor Zastępczy powinien na bieżąco prowadzić zestawienie wykonanych i zafakturowanych prac. Zestawienie powinno zawierać wszystkie pozycje z kosztorysów inwestorskich i ofertowych (oraz zamiennych, jeśli pojawią się na etapie realizacji) wraz z informacją o tym, jaki procent danej pozycji został zrealizowany i jaki procent został zafakturowany przez Wykonawcę. Zaktualizowane zestawienie powinno być przesyłane Zamawiającemu z każdą zaopiniowaną fakturą.
 45. Faktury zaopiniowane niewłaściwie, bądź niezaopiniowane faktury nie będą uznawane.
 46. Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych lub dokonanie innych potrąceń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umów,
 47. Reprezentowanie Zamawiającego przed organami Administracji Publicznej.

Data ogłoszenia: 11.12.2020

48. Występowanie w imieniu Zamawiającego do gestorów sieci (w razie konieczności).

II. Obowiązki Inwestora Zastępczego związane z odbiorem robót budowlanych:

1. Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, skoordynowanie odbioru, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji.
2. Egzekwowanie usunięcia przez Projektanta i Wykonawców usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.
3. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości do odbioru robót oraz potwierdzenie należytego urządzenia i uporządkowania terenu budowy.
4. Po zakończeniu realizowanej inwestycji przekazanie Zamawiającemu:
 - a) rozliczenia końcowego inwestycji
 - b) wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie robót zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami,
 - c) dokumentów, na podstawie których Zamawiający będzie mógł dochodzić należnych roszczeń od Projektanta, Wykonawcy i ewentualnie innych jednostek, z którymi Inwestor Zastępczy pozostawał w stosunku prawnym lub działał w imieniu Zamawiającego.
5. Skompletowanie dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączenie do nich opracowanej przez siebie oceny jakości wraz z jej uzasadnieniem, w/w dokumenty Inspektor przedstawia komisji odbioru końcowego.
6. Uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego Obiektu lub w odbiorach częściowych, uczestniczenie w przekazaniu Obiektu lub jego części do użytku.
7. Koordynacja odbiorów specjalistycznych, w tym m.in.: Państwowej Straży Pożarnej i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów (jeżeli dotyczy).
8. Wyegzekwowanie od Wykonawcy sporządzenia karty gwarancyjnej oraz instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu.
9. Po ostatecznym dokonaniu odbioru robót budowlanych - przejęcie od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz Dziennika budowy i książki obmiaru. Dokładne i rzetelne sprawdzenie pod względem rzeczowym, ilościowym i kosztowym dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysów powykonawczych i pozostałych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz przekazanie ich Inwestorowi wraz z opinią.
10. Sprawdzenie i zatwierdzenie wykonanego przez Wykonawcę zestawienia kwalifikacji kosztów pełnego zakresu prac pod względem księgowym (remont, modernizacja) oraz, w sytuacji zaistnienia, wykazu maszyn i urządzeń oddanych do użytkowania, stanowiących według odrębnych przepisów samodzielne środki trwałe i określenie ich wartości wraz z montażem.

Data ogłoszenia: 11.12.2020

11. Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych z inwestycją, zgodnie z Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji związanych zagadnieniami BHP wynikającymi z przeznaczenia budynku.
12. Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Wykonawcy za niewykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty wynikać będzie z zawartej z Wykonawcą umowy.
13. Opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty.
14. Opracowanie raportu końcowego z wykonania umowy z uwzględnieniem następujących elementów: krótki opis projektu, zmiany dokonane w dokumentacji projektowej, opis organizacji i zarządzania umową, postęp robót, zgodność ich wykonywania z założeniami, osiągnięta jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi, ewentualne przyczyny wystąpienia wad, przyczyny ewentualnej zmiany zaakceptowanej kwoty umowy, analiza płatności, końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót, uwagi i wnioski.

13. Przygotowanie i przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych,

Obowiązki Inwestora Zastępczego w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę obejmują w szczególności:

1. Dokonywanie z Projektantem niezbędnych uzgodnień oraz egzekwowanie usuwania wad i usterek w dokumentacji projektowej w ramach rękojmi i gwarancji jakości tej dokumentacji oraz uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego w zakresie:
 - a) uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
 - b) uzupełnienia dokumentacji i Wyjaśniania wątpliwości dotyczących realizacji projektu.
2. Powołanie w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia wady lub usterki – komisji ustalającej występowanie wad, ich zakres oraz przyczyny ich powstania.
3. Uczestniczenie w pracach komisji powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad. Ustalanie zakresu rzeczowego wad i usterek wymagających usunięcia, jak również terminu, w którym mają być usunięte.
4. Po potwierdzeniu przez Komisję wystąpienia wad lub usterek, niezwłocznego przygotowania pisma, zgłaszającego wady i usterki oraz doręczenia go Wykonawcy.

Data ogłoszenia: 11.12.2020

5. Egzekwowania od Wykonawcy inwestycji szybkiego i terminowego usuwania potwierdzonych wad.
6. Protokolarnego stwierdzenia przez komisję z udziałem Zamawiającego oraz inspektora nadzoru usunięcia wad przez Wykonawcę.
7. Dochodzenia na wniosek Zamawiającego od Wykonawcy inwestycji roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji, w tym również na drodze postępowania sądowego.
8. Przygotowania i dokonania odbiorów przed upływem terminów rękojmi i gwarancji.
9. Przygotowania 2 przeglądów gwarancyjnych: po roku i po 5 latach od oddania obiektu przez poszczególnych wykonawców.

Rozliczenie Inwestora Zastępczego:

1. Po dokonaniu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie to wymagane przez przepisy prawa) oraz rozliczeniu końcowym robót budowlanych - zostanie sporządzony protokół wykonania przez Inwestora Zastępczego czynności Związanych z umową.
2. Zamawiający podpisze protokół, o którym mowa w ust. 1 pod warunkiem dostarczenia przez Inwestora Zastępczego w szczególności dokumentów:
 - a) protokołu odbioru końcowego inwestycji wraz z ewentualnie sporządzonymi protokołami usunięcia wad stwierdzonych podczas odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
 - b) końcowego rozliczenia robót budowlanych,
 - c) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (o ile będzie to wymagane przez przepisy prawa).
 - d) dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi adaptacjami, poprawkami, dokumentami zamiennymi sporządzonymi w toku inwestycji,
 - e) kompletu dokumentów odbiorowych umożliwiających eksploatację obiektu,
 - f) korespondencji i innych dokumentów dotyczących inwestycji,
 - g) raportu końcowego o którym mowa w p-kcie. III, ust. 15,
 - h) karty/kart gwarancyjnej/ych inwestycji,
 - i) harmonogramu przeglądów wynikających z gwarancji i rękojmi, udzielonych przez Wykonawcę.
3. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do dostarczenia wymienionych wyżej dokumentów nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, a w przypadku, gdy jej uzyskanie nie będzie wymagane przez przepisy prawa, od dnia odbioru końcowego inwestycji.
4. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust.1, jest podstawą do ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia Inwestora Zastępczego.

Data ogłoszenia: 11.12.2020

5. Wszelkie opracowania określone w niniejszym załączniku, które będą przygotowywane i przedstawiane Zamawiającemu przez Inwestora Zastępczego, będą przekazywane w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC/DOCX lub PDF, DWG (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na innych nośnikach np. CD/DVD/Pendrive). W przypadku niektórych dokumentów Strony mogą stosownie do potrzeb określić inną formę ich przekazania.

Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia/dostawy/usługi:

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: nie później niż 31.12.2022


Od tego terminu Inwestor Zastępczy będzie pełnił obowiązki związane z okresem rękojmi i gwarancji.

Informacje dodatkowe:

I. Inwestor Zastępczy:

1. Inwestor Zastępczy powinien zapewnić kadre kierowniczą o wszelkich niezbędnych uprawnieniach i doświadczeniu oraz płynnej znajomości języka angielskiego.
2. Inwestor Zastępczy zapewni do obsługi inwestycji zespół według poniższego schematu:

Data ogłoszenia: 11.12.2020

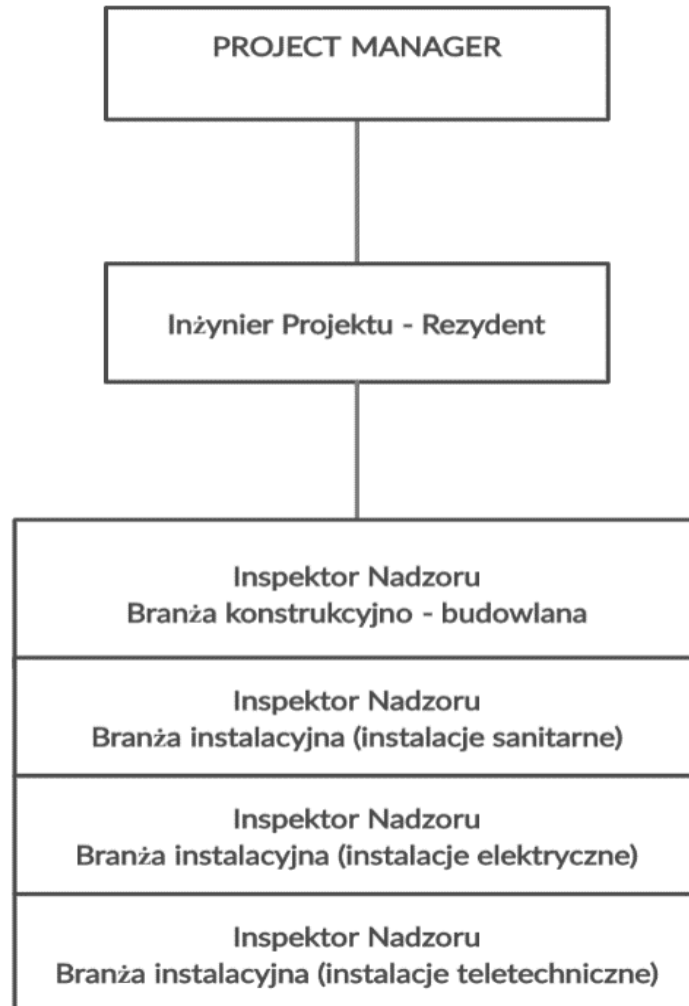

3. Inwestor Zastępczy powinien zapewnić Minimum 2-osobowy zespół do zarządzania projektem (Project Managera oraz Inżyniera Projektu, który na etapie realizacji prac budowlanych i wykończeniowych będzie pełnił funkcję rezydenta). Inwestor Zastępczy zapewni również zespół złożony z minimum 4 Inspektorów Nadzoru, którzy sprawdzą dokumentację projektową oraz będą uczestniczyć w postępowaniach przetargowych, oraz będą sprawować nadzór inwestorski w trakcie realizacji prac budowlanych i wykończeniowych. Inżynier Projektu – Rezydent, w trakcie realizacji prac budowlanych i wykończeniowych powinien sprawować stały nadzór prac na terenie budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość rozdzielenia funkcji Inżyniera Projektu i Inżyniera – Rezydenta (z jednoczesnym powiększeniem liczebności zespołu, z zastrzeżeniem, że Inżynier Rezydent będzie sprawować stały nadzór prac na terenie budowy. Dopuszczalne jest również połączenie funkcji Inżyniera Rezydenta z funkcją Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej. Inwestor Zastępczy zapewni zespół dedykowany do pracy przy zadaniu

Data ogłoszenia: 11.12.2020

inwestycyjnym zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 2. W przypadku niemożności wypełniania obowiązków przez wskazaną osobę do zespołu, Inwestor Zastępczy ma obowiązek zapewnić zastępstwo o tożsamyh kwalifikacjach. Inwestor Zastępczy ma obowiązek zgłosić zaistnienie konieczności zastąpienia członka zespołu i przedstawienie kwalifikacji osoby zastępującej. Inwestor Zastępczy będzie mógł powierzyć obowiązki osobie zastępującej dopiero po jej akceptacji przez Zamawiającego. Inwestor Zastępczy zapewni zespół dedykowany do pracy przy zadaniu inwestycyjnym zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 2. W przypadku niemożności wypełniania obowiązków przez wskazaną osobę do zespołu, Inwestor Zastępczy ma obowiązek zapewnić zastępstwo o tożsamyh kwalifikacjach. Inwestor Zastępczy ma obowiązek zgłosić zaistnienie konieczności zastąpienia członka zespołu i przedstawienie kwalifikacji osoby zastępującej. Inwestor Zastępczy będzie mógł powierzyć obowiązki osobie zastępującej dopiero po jej akceptacji przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza również pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych przez jedną osobę.

4. Inwestor Zastępczy, na etapie realizacji prac budowlanych i wykończeniowych, zorganizuje terenowe biuro w Lublinie, aby móc sprawować stały nadzór robót. Stały nadzór robót będzie sprawowany przez Inżyniera Rezydenta.
5. Stały nadzór sprawowany przez Inżyniera Rezydenta realizowany będzie poprzez codzienne, minimum 4-godzinne wizyty na terenie budowy w dniach, w których realizowane będą prace budowlane i wykończeniowe – od momentu przekazania terenu budowy Generalnemu Wykonawcy do odebrania prac bezusterkowym protokołem odbioru (włączając weekendy – jeśli GW realizować będzie prace również w tych dniach)
6. Inwestor Zastępczy zapewni zespoły Inspektorów Nadzoru działających na rynku lokalnym.
7. Inwestor Zastępczy zapewni, że Inspektorzy Nadzoru:
 - Będą wizytować teren robót minimum 2 raz w tygodniu
 - Na wezwanie Inżyniera Projektu, Project Managera, bądź Zamawiającego zwiększą częstotliwość wizytowania (w uzasadnionych przypadkach zależnych od sytuacji na budowie)
 - Będą odbywać dodatkowe wizyty na budowie na wezwanie Zamawiającego w terminach wskazanych przez Zamawiającego
 - Dodatkowe wizyty na budowie na wezwanie Zamawiającego będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 48h od wezwania.
 - Będą uczestniczyć we wszystkich naradach koordynacyjnych,
8. Inwestor Zastępczy pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego będzie działał w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie zgodnym ze Specyfikacją przedmiotu zamówienia oraz umową.

Data ogłoszenia: 11.12.2020

9. W ramach wykonywanych czynności Inwestor Zastępczy nie ma prawa do podpisywania umów i zaciągania żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących zadanie inwestycyjne
10. Inwestor Zastępczy nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcom robót budowlanych i Projektantom poleceń wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych.
11. Inwestor Zastępczy będzie wykonywał swoje czynności na podstawie podpisanej umowy, której wzór stanowi załącznik nr 8 do zapytania ofertowego i udzielonych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy pełnomocnictw.
12. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do składania Zamawiającemu dwutygodniowych, pisemnych raportów, zawierających informacje o czynnościach wykonywanych przez Inwestora Zastępczego, stanie zaawansowania realizowanych robót budowlanych, oraz wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w realizacji inwestycji w terminie 3 dni od zakończenia okresu, którego dotyczy raport.
13. Zamawiający będzie mógł doraźnie wymagać od Inwestora Zastępczego przedstawiania raportów częściej, jeśli w ocenie Zamawiającego będzie to konieczne.
14. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych w Związku z realizacją inwestycji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, Kodeksu cywilnego oraz obowiązków wynikających z Prawa administracyjnego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, a w szczególności z ustaw: Prawo budowlane, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o wyrobach budowlanych, aktów wykonawczych, a także aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych znajdujących zastosowanie do niniejszej inwestycji.
15. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się wykonać wszystkie prace związane z realizacją niniejszej inwestycji, które dadzą się przewidzieć, a nie zostały wyszczególnione w specyfikacji przedmiotu zamówienia w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.
16. W toku wykonywania umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 8, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego, w tym do prawidłowego, zgodnego z prawem, zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami Zamawiającego wykonania inwestycji.
17. Inwestor Zastępczy ponosi wobec Inwestora odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nie wykonania bądź nienależytego wykonania czynności zleconych niniejszą umową.
18. Praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy Inwestor Zastępczy nie może powierzyć osobie trzeciej bez zgody Inwestora.
19. Wszelka dokumentacja powstała w trakcie realizacji umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 8, (m.in. notatki, protokoły) przechodzi na własność Zamawiającego. Inwestor Zastępczy oświadczy, iż przekazuje Zamawiającemu prawa autorskie do całej sporządzonej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji.

Data ogłoszenia: 11.12.2020

20. Przedmiot umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 8, zostanie wykonany w oparciu o dokumentację opracowaną na zlecenie Inwestora.
21. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor Zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.
22. Inwestora Zastępczego obowiązuje zakres czynności, jaki dla Inspektora nadzoru przewiduje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz wszelkie inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.
23. Zamawiający nie przewiduje całkowitego wyłączenia obiektu z użytkowania na czas realizowanych prac.

II. Informacje o obiekcie

Hotel Huzar – Rzuty Budynku – Załącznik nr 10

Przedmiotowy hotel zlokalizowany jest przy ulicy Spadochroniarzy 9 w Lublinie. Składa się z dwóch segmentów – wyższego siedmiokondygnacyjnego oraz niższego, dwukondygnacyjnego. W sąsiedztwie zlokalizowany jest budynek usługowy oraz mieszkalne wielorodzinne. Budynek usługowy zlokalizowany jest w odległości ok. 0,5 m od niższej, dwukondygnacyjnej części Hotelu. Budynki wielorodzinne zlokalizowane są w dużej odległości od przedmiotowego obiektu. Wysokość mierzona od poziomu przylegającego do budynku najniżej położonego terenu, do stropu nad ostatnią kondygnacją przeznaczoną dla użytku ludzi wraz z warstwą ocieplającą w części wyższej, wynosi 21,52 metra, tak więc ze względu na ten parametr, obiekt klasyfikowany jest do budynków średniowysokich (SW). W części dwukondygnacyjnej wysokość budynku do stropu nad ostatnią kondygnacją przeznaczoną dla użytku ludzi wraz z warstwą ocieplającą wynosi 8,03.

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 7034,15 m², w tym poszczególnych kondygnacji:

- piwnica - 1056,38 m²,
- parter - 1366,12 m²,
- I piętro - 1124,76 m²,
- II piętro - 872,06 m²,
- III piętro - 861,17 m²,
- IV piętro - 871,61 m²,
- V piętro - 882,05 m².

Data ogłoszenia: 11.12.2020

Kubatura obiektu wynosić będzie natomiast:

- część nadziemna - 15558,02 m³
- część piwniczna - 2384,43 m³
